




STATO AVANZAMENTO LAVORI PER AREA

27/07/09

Ore 24.00

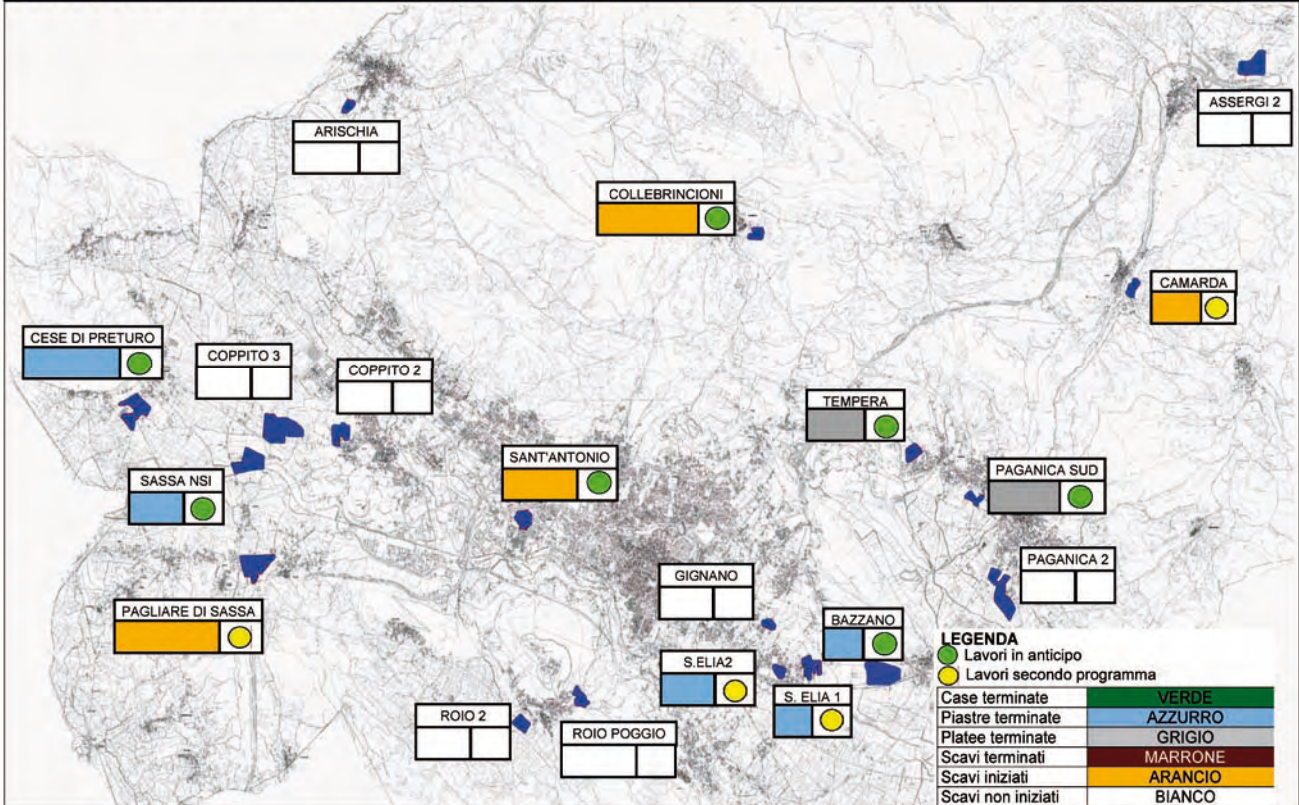

LEGENDA

- Lavori in anticipo
- Lavori secondo programma

Casse terminate	VERDE
Piastre terminate	AZZURRO
Platee terminate	GRIGIO
Scavi terminati	MARRONE
Scavi iniziati	ARANCIO
Scavi non iniziati	BIANCO



OBIETTIVI DELLA SETTIMANA IN CORSO E DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA			27/07/09	Ore 24.00				
Attività settimana precedente		Attività settimana in corso		Attività prossima settimana				
13/07/2009	-	19/07/2009	20/07/2009	-	26/07/2009	27/07/2009	-	02/08/2009
- Completate le piastre nell'area 8. Bazzano, 9. S. Elia 1, 10. S. Elia 2 e 14. Sassa NSI. - Completate le prime piastre nelle aree 1. S. Antonio, 4. Pagliare di Sassa, 5-11. Paganica Sud, e 7. Tempera - Apertura del cantiere 2. Collebrincioni - Consegnate tutte le piastre dell'area 14. Sassa NSI		- Dopo la conferenza dei servizi della scorsa settimana iniziano le attività nelle nuove aree: 20. Arischia, 22. Roio 2, 24. Paganica 2, 25. Gignano, 27. Coppito 3 - Prosieguo della costruzione degli edifici su 4 cantieri: 8. Bazzano, 3. Cese di Preturo, 9. S. Elia 1 e 14. Sassa NSI - Consegne di edifici alle imprese aggiudicatarie delle case all'area 1. S. Antonio, 4. Pagliare di Sassa e 10. S. Elia 2		- Continuare a pieno ritmo le attività di costruzione piastre nelle aree iniziate nella settimana precedente - Terminare la progettazione e avviare la preparazione dei cantieri delle aree 21. Roio Poggio e 26. Coppito 2 - Consegnare ulteriori edifici alle imprese aggiudicatarie delle case				

AVANZAMENTO GENERALE PROGETTO		25/07/09	Ore 24.00
Piastre iniziate (scavi)	103	su 164 edifici	63%
Piastre terminate (fondazioni)	82		50%
Piastre consegnate per la costruzione degli edifici	62		38%
Case iniziate	45		27%
Case completate	-		0%

N.B.: Il numero complessivo di edifici del progetto è stato incrementato a 164 rispetto alla previsione iniziale di 150



STATO AVANZAMENTO / AREA: DETTAGLIO

27/07/09

Ore 24.00

Nome	PIASTRE										EDIFICI									
	Previste	Completate	LAVORAZIONI IN CORSO								Iniziate	LAVORAZIONI IN CORSO								
			Scavi		Platee		Pilastr		Solai			Strutture		Impianti		Serramenti		Finiture		
			In Corso	Completati	In Corso	Completate	In Corso	Completati	In Corso	Completati		In Corso	Completate	In Corso	Completati	In Corso	Completate			
SANT'ANTONIO	11	7	1	9	-	9	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-		
COLLEBRINCIONI	3	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CESE DI PRETURO	20	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	16	16	-	7	-	4	-	4	-
PAGLIARE DI SASSA	11	2	1	7	2	5	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAGANICA SUD 1	3	2	-	3	-	3	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAGANICA SUD 2	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TEMPERA	8	3	-	8	-	8	-	8	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAZZANO	21	21	-	21	-	21	-	21	-	21	-	20	20	-	2	-	-	-	-	-
SANT'ELIA 1	7	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-
SANT'ELIA 2	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SASSA ZONA NSI	16	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
CAMARDA	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARISCHIA	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROIO POGGIO	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROIO 2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSERGI 2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGANICA 2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIGNANO	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COPPITO 2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COPPITO 3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AREE DI PROGETTO

PIASTRE PREVISTE

164

PIASTRE INIZIATE

103

PIASTRE COMPLETATE

82

EDIFICI ANTISISMICI PREVISTI

164

EDIFICI ANTISISMICI INIZIATI

45

EDIFICI ANTISISMICI COMPLETATI

-

Il numero totale di piastre è di 166. Il numero di 164 piastre è riferito ad un numero equivalente di piastre (in termini di area abitabile) in quanto alcune piastre hanno dimensioni ridotte a quelle standard (superficie 57m x 21m).
